

ArtSea

Tablica Kanban

Benjamin Jurewicz
198326

Piotr Kierznowski
197652

Marta Kociszewska
198143

Lidia Zawrzykraj
198257

1 . O PROJEKCIE I PRODUKCIE

Nazwa i Ogólna Koncepcja

- **ArtSea** - system zarządzania portfolio artysty
- **Ogólna koncepcja** - system planowany jest jako platforma, umożliwiająca artystom błyskawiczne generowanie własnych stron internetowych z ich twórczością

Adresowany Problem i Obszar Zastosowania

- **Problemy:**
 - Trudność techniczna: Artyści nie potrafią samodzielnie postawić (stworzyć) strony
 - Brak spójności: Portfolio w mediach społecznościowych są rozproszone i niespójne
 - Wysokie koszty: Zatrudnienie dewelopera jest zbyt drogie dla początkujących twórców
- **Obszar zastosowania:**
 - Sektor kreatywny, promocja sztuki w Internecie oraz digitalizacja dorobku artystycznego.

Rynek i Organizacja


- **Skala działalności:**
 - Projekt adresowany jest do twórców na poziomie krajowym i europejskim.
- **Rynek:**
 - Artyści niezależni, studenci uczelni artystycznych oraz małe galerie sztuki.

2 . STANY ZGŁOSZEŃ/ZADAŃ

Domyślny zestaw stanów został rozszerzony, aby odzwierciedlał zdefiniowaną wcześniej Definicję Ukończenia (Definition of Done). Na tablicy Kanban w Jira znajdują się następujące kolumny (stany):

Tabela 1: Stany zadań na tablicy Kanban

Stan	Opis	Kryteria ukończenia
DO ZROBIENIA (TO DO)	Zadania wybrane do realizacji w bieżącym sprincie, które jeszcze nie zostały rozpoczęte	Członek zespołu przypisuje zadanie do siebie i fizycznie rozpoczyna nad nim pracę
W TOKU (IN PROGRESS)	Zadania, nad którymi aktualnie trwają prace deweloperskie lub projektowe	Zakończenie implementacji kodu zgodnie ze standardami (Lint/Prettier) lub ukończenie projektów
10 maja 2026		Figura 3: Roz-

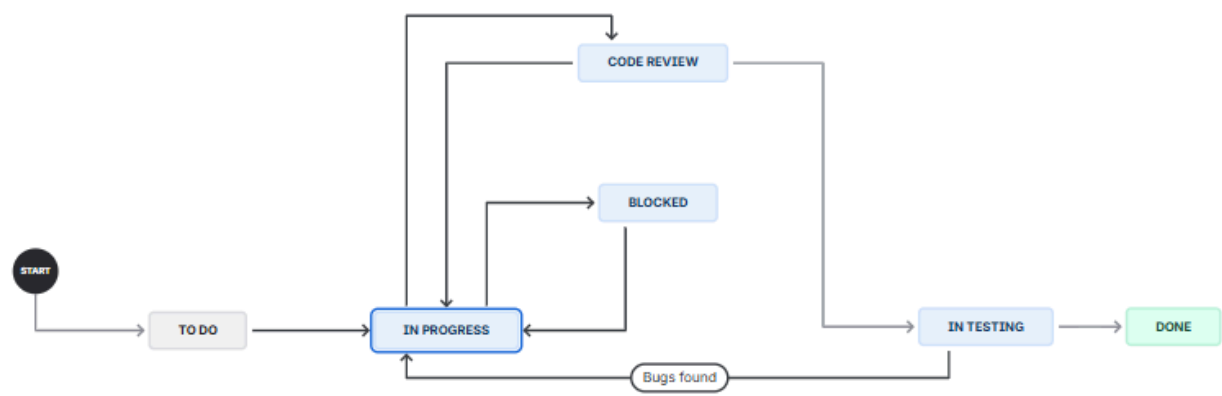

Rysunek 1: Zrzut ekranu z tablic Kanban w Jira

3 . LIMITY WIP (WORK IN PROGRESS)

Tabela 2: Stany zadań na tablicy Kanban

Stan	Limit	Uzasadnienie
DO ZROBIENIA (TO DO)	Limit wynikający z pojemności sprintu	Zgodnie z ustaleniami z poprzedniego etapu, średnia prędkość naszego zespołu została oszacowana na około 40 Story Points dla dwutygodniowej iteracji. Limit w tej kolumnie jest wyrażony w prostej liczbie zadań, lecz w maksymalnej sumie punktów złożoności. Aby plan był realistyczny i dostosowany do naszych możliwości (z uwzględnieniem 20% rezerwy czasowej), łączna waga zadań wybranych do realizacji w sprincie nie może przekroczyć 40 Story Points.
W TOKU (IN PROGRESS)	3	Zespół deweloperski liczy dokładnie 3 osoby. Limit 3 wymusza zasadę, według której każdy członek zespołu pracuje w danej chwili wyłącznie nad jednym zadaniem. Pozwala to na pełne skupienie, unikanie wielozadaniowości (context switching) i szybsze dostarczanie wartości.
ZABLOKOWANE (BLOCKED)	2	Stan zablokowania jest sytuacją wyjątkową. Jeśli więcej niż 2 zadania trafią do tej kolumny, oznacza to poważny problem z przepływem pracy (np. problemy ze środowiskiem, brak decyzji biznesowych). Limit ten wymusza na zespole natychmiastowe przerwanie innych prac i skupienie się na odblokowaniu zadań.
CODE REVIEW (IN REVIEW)	2	Każde zadanie wymaga akceptacji (Pull Requesta) przez przynajmniej jednego innego członka zespołu, na co przewidziano rezerwę czasową. Limit 2 zapobiega tworzeniu się „wąskiego gardła”. Wymusza to na zespole bieżące weryfikowanie kodu innych członków, zanim wezmą z kolumny TO DO kolejne zadania dla siebie.
TESTY (IN TESTING)	2	Za proces QA i testowanie odpowiada głównie jedna osoba. Zbyt wysoki limit w tej kolumnie mógłby doprowadzić do jej przeciążenia i zablokowania procesu dostarczania gotowego oprogramowania. Limit 2 pozwala na płynną i dokładną weryfikację funkcjonalności.
GOTOWE (DONE):	Brak limitu	Jest to kolumna końcowa, która gromadzi wszystkie zadania spełniające kryteria „Definition of Done”. Jej celem jest pokazywanie przyrostu ukończonego produktu, dlatego nie ogranicza się w niej liczby kart.

4 . TABLICA KANBAN

5 . METRYKI PRODUKTYWNOŚCI
