

# ArtSea

## Tablica Kanban

Benjamin Jurewicz  
198326

Piotr Kierznowski  
197652

Marta Kociszewska  
198143

Lidia Zawrzykraj  
198257

## 1 . O PROJEKCIE I PRODUKCIE

### Nazwa i Ogólna Koncepcja

- **ArtSea** - system zarządzania portfolio artysty
- **Ogólna koncepcja** - system planowany jest jako platforma, umożliwiająca artystom błyskawiczne generowanie własnych stron internetowych z ich twórczością

### Adresowany Problem i Obszar Zastosowania

- **Problemy:**
  - Trudność techniczna: Artyści nie potrafią samodzielnie postawić (stworzyć) strony
  - Brak spójności: Portfolio w mediach społecznościowych są rozproszone i niespójne
  - Wysokie koszty: Zatrudnienie dewelopera jest zbyt drogie dla początkujących twórców
- **Obszar zastosowania:**
  - Sektor kreatywny, promocja sztuki w Internecie oraz digitalizacja dorobku artystycznego.

### Rynek i Organizacja


- **Skala działalności:**
  - Projekt adresowany jest do twórców na poziomie krajowym i europejskim.
- **Rynek:**
  - Artyści niezależni, studenci uczelni artystycznych oraz małe galerie sztuki.

## 2 . STANY ZGŁOSZEŃ/ZADAŃ

Domyślny zestaw stanów został rozszerzony, aby odzwierciedlał zdefiniowaną wcześniej Definicję Ukończenia (Definition of Done). Na tablicy Kanban w Jira znajdują się następujące kolumny (stany):

Tabela 1: Stany zadań na tablicy Kanban

| Stan                    | Opis                                                                                                                                | Kryteria ukończenia                                                                                    |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DO ZROBIENIA (TO DO)    | Zadania wybrane do realizacji w bieżącym sprincie, które jeszcze nie zostały rozpoczęte                                             | Członek zespołu przypisuje zadanie do siebie i fizycznie rozpoczyna nad nim pracę                      |
| W TOKU (IN PROGRESS)    | Zadania, nad którymi aktualnie trwają prace deweloperskie lub projektowe                                                            | Zakończenie implementacji kodu zgodnie ze standardami (Lint/Prettier) lub ukończenie projektów w Figma |
| ZABLOKOWANE (BLOCKED)   | Oznacza, że prace nad zadaniem nie mogą być kontynuowane (np. z powodu braku dostępu, błędów środowiska lub oczekiwania na decyzję) | Rozwiązanie problemu blokującego (powrót do „W TOKU”)                                                  |
| CODE REVIEW (IN REVIEW) | Kod został napisany i czeka na weryfikację przez innego członka zespołu, co jest wymogiem w projekcie                               | Akceptacja zmian (Pull Requesta) przez inną osobę z zespołu                                            |
| TESTY (IN TESTING)      | Kod przeszedł weryfikację i czeka na manualne testy funkcjonalności na środowisku lokalnym/deweloperskim                            | Kryterium przejścia: Pomyślne przejście testów realizowanych przez osobę odpowiedzialną za QA          |
| GOTOWE (DONE):          | Stan końcowy dla zadań, które zostały w pełni zrealizowane, zweryfikowane i są gotowe do uznania za część przyrostu produktu        | Zadanie spełnia wszystkie kryteria akceptacji oraz Definicję Ukończenia                                |

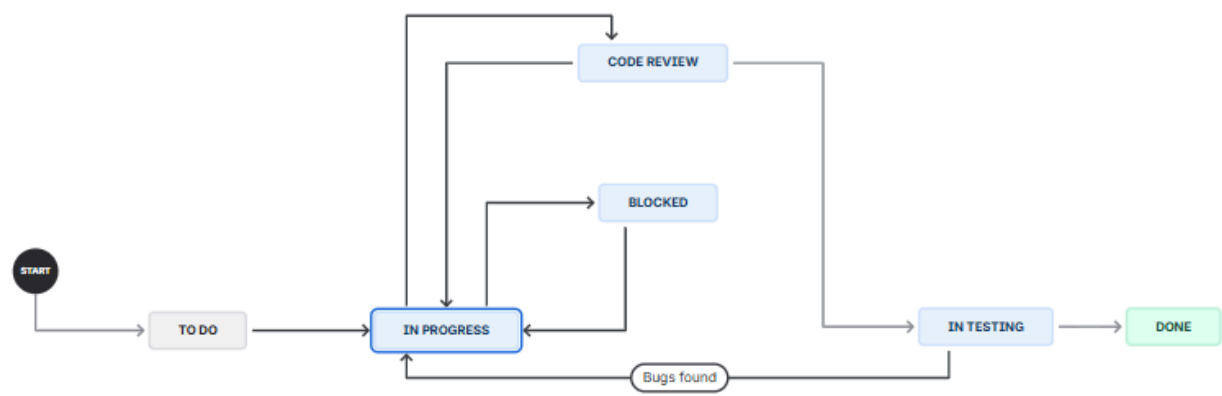


Rysunek 1: Zrzut ekranu z tablic Kanban w Jira

### 3 . LIMITY WIP (WORK IN PROGRESS)

Tabela 2: Stany zadań na tablicy Kanban

| Stan                    | Limit                                 | Uzasadnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DO ZROBIENIA (TO DO)    | Limit wynikający z pojemności sprintu | Zgodnie z ustaleniami z poprzedniego etapu, średnia prędkość naszego zespołu została oszacowana na około 40 Story Points dla dwutygodniowej iteracji. Limit w tej kolumnie jest wyrażony w prostej liczbie zadań, lecz w maksymalnej sumie punktów złożoności. Aby plan był realistyczny i dostosowany do naszych możliwości (z uwzględnieniem 20% rezerwy czasowej), łączna waga zadań wybranych do realizacji w sprincie nie może przekroczyć 40 Story Points. |
| W TOKU (IN PROGRESS)    | 3                                     | Zespół deweloperski liczy dokładnie 3 osoby. Limit 3 wymusza zasadę, według której każdy członek zespołu pracuje w danej chwili wyłącznie nad jednym zadaniem. Pozwala to na pełne skupienie, unikanie wielozadaniowości (context switching) i szybsze dostarczanie wartości.                                                                                                                                                                                    |
| ZABLOKOWANE (BLOCKED)   | 2                                     | Stan zablokowania jest sytuacją wyjątkową. Jeśli więcej niż 2 zadania trafią do tej kolumny, oznacza to poważny problem z przepływem pracy (np. problemy ze środowiskiem, brak decyzji biznesowych). Limit ten wymusza na zespole natychmiastowe przerwanie innych prac i skupienie się na odblokowaniu zadań.                                                                                                                                                   |
| CODE REVIEW (IN REVIEW) | 2                                     | Każde zadanie wymaga akceptacji (Pull Requesta) przez przynajmniej jednego innego członka zespołu, na co przewidziano rezerwę czasową. Limit 2 zapobiega tworzeniu się „wąskiego gardła”. Wymusza to na zespole bieżące weryfikowanie kodu innych członków, zanim wezmą z kolumny TO DO kolejne zadania dla siebie.                                                                                                                                              |
| TESTY (IN TESTING)      | 2                                     | Za proces QA i testowanie odpowiada głównie jedna osoba. Zbyt wysoki limit w tej kolumnie mógłby doprowadzić do jej przeciążenia i zablokowania procesu dostarczania gotowego oprogramowania. Limit 2 pozwala na płynną i dokładną weryfikację funkcjonalności.                                                                                                                                                                                                  |
| GOTOWE (DONE):          | Brak limitu                           | Jest to kolumna końcowa, która gromadzi wszystkie zadania spełniające kryteria „Definition of Done”. Jej celem jest pokazywanie przyrostu ukończonego produktu, dlatego nie ogranicza się w niej liczby kart.                                                                                                                                                                                                                                                    |

## 4. TABLICA KANBAN

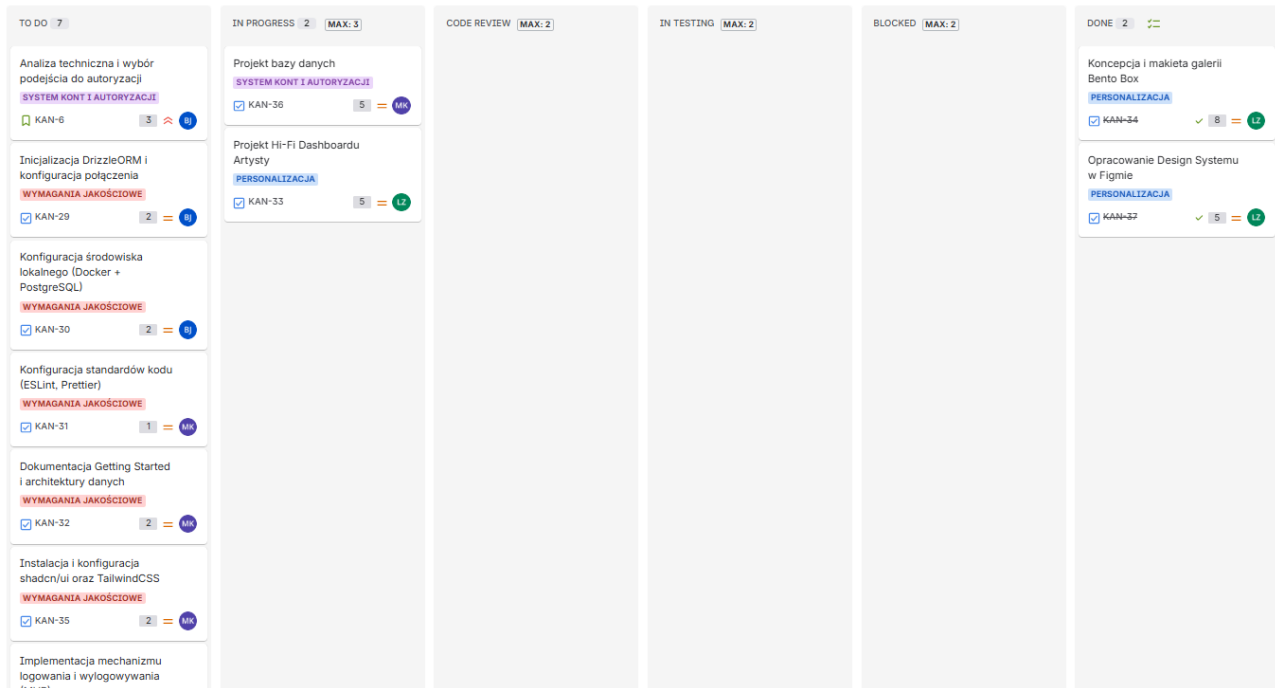

Rysunek 2: Zrzut ekranu z tablicy sprintu w Jira

## 5. METRYKI PRODUKTYWNOŚCI

### Czas Cyklu (Cycle Time)

Czas poświęcony na realizację zadania. Liczony od momentu przesunięcia karty z kolumny *TO DO* do *IN PROGRESS*, aż do momentu osiągnięcia statusu *DONE*.

**Cel monitorowania:** Pozwala ocenić rzeczywistą efektywność dewelopmentu i sprawdzić, czy złożoność zadań (wyrażona w Story Points) przekłada się na przewidywalny czas ich wykonania.

### Czas Realizacji (Lead Time)

Całkowity czas życia zadania w sprincie. Liczony od momentu utworzenia i przypisania karty do sprintu (pojawienia się w *TO DO*), do momentu jej całkowitego ukończenia (*DONE*).

**Cel monitorowania:** Daje obraz tego, jak szybko zespół potrafi dostarczyć zaplanowaną wartość od momentu podjęcia zobowiązania (rozpoczęcia sprintu).

### Przepływ Pracy (Throughput)

Liczbę ukończonych zadań (kart w statusie *DONE*) oraz zrealizowanych Story Points w zadanym przedziale czasu (np. na tydzień pracy w dwutygodniowym sprincie).

**Cel monitorowania:** Weryfikacja, czy rzeczywiste tempo pracy pokrywa się z naszą estymowaną średnią prędkością zespołu (Velocity) wynoszącą 40 Story Points na sprint.

### Liczba Kart/Zgłoszeń na Osobę (wip per Assignee)

Aktywną liczbę zadań (szczególnie w kolumnach roboczych) przypisanych do każdego z 3 członków zespołu w danej chwili

**Cel monitorowania:** Zapewnienie zrównoważonego podziału obowiązków.
