

# ArtSea

## Scrum: Backlog Sprintu

Benjamin Jurewicz  
198326

Piotr Kierznowski  
197652

Marta Kociszewska  
198143

Lidia Zawrzykraj  
198257

## 1. OPIS PROJEKTU I PRODUKTU

### Nazwa i Ogólna Koncepcja

- **ArtSea** - system zarządzania portfolio artysty
- **Ogólna koncepcja** - system planowany jest jako platforma, umożliwiająca artystom błyskawiczne generowanie własnych stron internetowych z ich twórczością

### Adresowany Problem i Obszar Zastosowania

- **Problemy:**
  - Trudność techniczna: Artyści nie potrafią samodzielnie postawić (stworzyć) strony
  - Brak spójności: Portfolio w mediach społecznościowych są rozproszone i niespójne
  - Wysokie koszty: Zatrudnienie dewelopera jest zbyt drogie dla początkujących twórców
- **Obszar zastosowania:**
  - Sektor kreatywny, promocja sztuki w Internecie oraz digitalizacja dorobku artystycznego.

### Rynek i Organizacja

- **Skala działalności:**
  - Projekt adresowany jest do twórców na poziomie krajowym i europejskim.
- **Rynek:**
  - Artyści niezależni, studenci uczelni artystycznych oraz małe galerie sztuki.


## 2. OSZACOWANIE ROZMIARU BACKLOGU PRODUKTU

W celu oszacowania pracochłonności zadań w backlogu produktu, zespół przeprowadził sesję Planning Poker. Wykorzystano skalę opartą na ciągu Fibonacciego (1, 2, 3, 5, 8, 13). Proces ten pozwolił na wspólną dyskusję nad złożonością każdego z zadań, co zminimalizowało ryzyko błędnych estymacji wynikających z indywidualnego postrzegania trudności. Estymacja skupiła się na elementach wybranych do realizacji w pierwszym sprincie, co pozwoliło na precyzyjne określenie zakresu prac.

Tabela 1: Oszacowanie pracochłonności elementów backlogu produktu

| Klucz  | Nazwa zadania                                            | Story Points |
|--------|----------------------------------------------------------|--------------|
| KAN-6  | Analiza techniczna i wybór podejścia do autoryzacji      | 3            |
| KAN-7  | Implementacja mechanizmu logowania i wylogowywania (MVP) | 5            |
| KAN-8  | Dodawanie pracy do portfolio                             | 3            |
| KAN-9  | Edycja pracy                                             | 2            |
| KAN-10 | Usuwanie pracy                                           | 1            |
| KAN-11 | Dodawanie kategorii prac                                 | 2            |
| KAN-12 | Edytowanie kategorii prac                                | 2            |
| KAN-13 | Optymalizacja czasu ładowania grafik                     | 3            |
| KAN-14 | Interaktywny edytor Bento Box                            | 8            |
| KAN-15 | Wybór motywu kolorystycznego i czcionek                  | 2            |
| KAN-16 | Zarządzanie sekcją „O mnie”                              | 3            |
| KAN-17 | Responsywność interfejsu                                 | 3            |
| KAN-18 | Przeglądanie galerii                                     | 3            |
| KAN-19 | Moduł wielojęzyczny                                      | 5            |
| KAN-20 | Certyfikat SSL                                           | 1            |
| KAN-21 | Integracja z mediami społecznościowymi                   | 3            |
| KAN-24 | Obsługa wielu formatów plików graficznych                | 3            |
| KAN-25 | Brak utraty danych przy przerwanej sesji                 | 5            |
| KAN-26 | Obsługa najpopularniejszych przeglądarek i systemów      | 3            |
| KAN-27 | Usuwanie kategorii prac                                  | 1            |
| KAN-29 | Inicjalizacja DrizzleORM i konfiguracja połączenia       | 2            |

|        |                                                         |   |
|--------|---------------------------------------------------------|---|
| KAN-30 | Konfiguracja środowiska lokalnego (Docker + PostgreSQL) | 2 |
| KAN-31 | Konfiguracja standardów kodu (ESLint, Prettier)         | 1 |
| KAN-32 | Dokumentacja Getting Started i architektury danych      | 2 |
| KAN-33 | Projekt Hi-Fi Dashboardu Artysty                        | 5 |
| KAN-34 | Koncepcja i makieta galerii Bento Box                   | 8 |
| KAN-35 | Instalacja i konfiguracja shadcn/ui oraz TailwindCSS    | 2 |
| KAN-36 | Projekt bazy danych                                     | 5 |
| KAN-37 | Opracowanie Design Systemu w Figma                      | 5 |

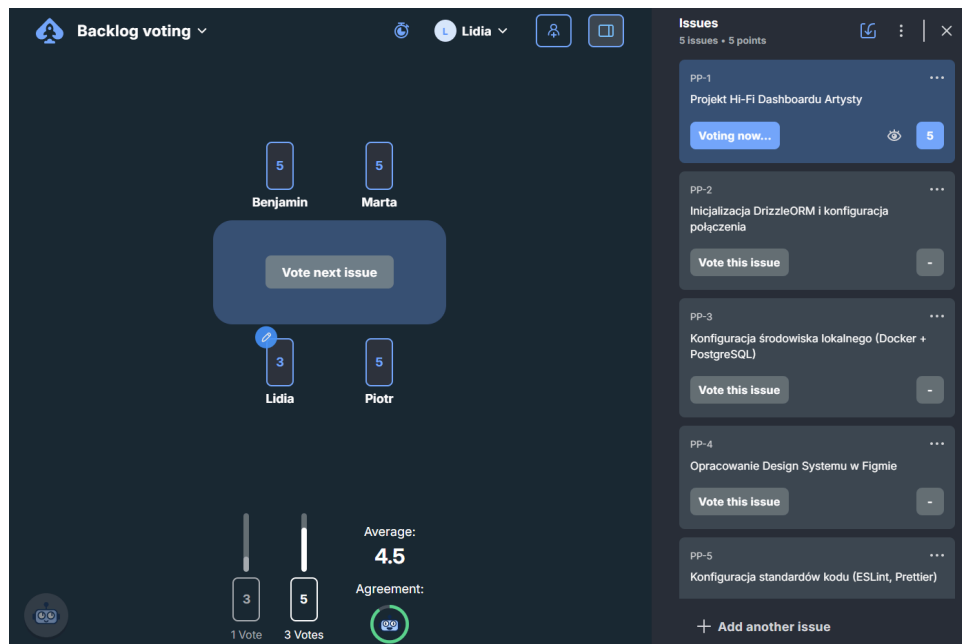

Rysunek 1: Przebieg sesji Planning Poker

### 3. ZAŁOŻENIA I DOBÓR ZAKRESU SPRINTU

Pierwszy sprint został zaplanowany jako iteracja dwutygodniowa. Przyjęto następujące założenia dotyczące pojemności zespołu:

- Zespół składa się z 3 osób bezpośrednio zaangażowanych w zadania techniczne i projektowe (Benjamin, Lidia, Marta).
- Przyjęto rezerwę czasową (ok. 20%) na spotkania statusowe, proces Code Review oraz dokumentację bieżącą.
- Średnia prędkość (velocity) zespołu została oszacowana na około 40 Story Points.

Dobór zakresu sprintu podyktowany był koniecznością stworzenia fundamentów systemu. Wybrano zadania z obszarów:

- **Infrastruktura:** Konfiguracja środowiska (Docker, PostgreSQL, DrizzleORM) jest niezbędna do rozpoczęcia jakichkolwiek prac programistycznych.
- **Bezpieczeństwo:** Autoryzacja stanowi fundament dostępu do panelu artysty.
- **Design i UX:** Opracowanie Design Systemu oraz makiet Dashboardu i Bento Box (kluczowej funkcji systemu) pozwoli na równoległe prowadzenie prac frontendowych w kolejnych iteracjach.
- **Architektura danych:** Projektowanie modeli bazy danych (artpiece, category i inne)

### 4. CEL SPRINTU

Uruchomienie infrastruktury technicznej (Docker, PostgreSQL, DrizzleORM), wybór i implementacja mechanizmu autoryzacji oraz opracowanie spójnego Design Systemu i makiet kluczowych funkcjonalności (Dashboard, Bento Box).

### 5. BACKLOG SPRINTU

Poniższa tabela przedstawia szczegółowy backlog pierwszego sprintu. Przyjęto przelicznik 1 Story Point (SP) = 1.5 godziny pracy.

Tabela 2: Backlog Sprintu 1

| Epic           | ID     | Nazwa zadania                     | Osoba    | SP | Czas (h) |
|----------------|--------|-----------------------------------|----------|----|----------|
| Infrastruktura | KAN-30 | Konfiguracja Docker + PostgreSQL  | Benjamin | 2  | 3        |
| Infrastruktura | KAN-29 | Inicjalizacja DrizzleORM          | Benjamin | 2  | 3        |
| Infrastruktura | KAN-31 | Standardy kodu (ESLint, Prettier) | Marta    | 1  | 1.5      |
| Infrastruktura | KAN-35 | Konfiguracja shadcn/ui + Tailwind | Lidia    | 2  | 3        |
| Infrastruktura | KAN-32 | Dokumentacja architektury danych  | Marta    | 2  | 3        |
| Autoryzacja    | KAN-6  | Analiza podejścia do autoryzacji  | Benjamin | 3  | 4.5      |
| Autoryzacja    | KAN-7  | Logowanie i wylogowywanie (MVP)   | Benjamin | 5  | 7.5      |
| Autoryzacja    | KAN-36 | Projekt bazy danych (modele)      | Marta    | 5  | 7.5      |
| Design         | KAN-37 | Design System w Figmie            | Lidia    | 5  | 7.5      |
| Design         | KAN-33 | Projekt Hi-Fi Dashboardu          | Lidia    | 5  | 7.5      |
| Design         | KAN-34 | Makieta galerii Bento Box         | Lidia    | 8  | 12       |
| Suma           |        |                                   |          | 40 | 60       |

6 . KRYTERIA AKCEPTACJI

Wybrane przykłady kryteriów akceptacji:

System Autoryzacji (kan-7)

🔗 KAN-22 / 📄 KAN-7

Implementacja mechanizmu logowania i wylogowywania (MVP)



Description

Wdrożenie podstawowej logiki autoryzacji.

Kryteria Akceptacji:

- Istnieją Route Handlers dla `/api/auth/login` i `/api/auth/logout`.
- Logowanie ustawia bezpieczne ciasteczko sesyjne (HttpOnly).
- Wylogowanie unieważnia sesję.
- Middleware Next.js blokuje dostęp do tras admina dla niezalogowanych.

Rysunek 2: Kryteria akceptacji dla zadania KAN-7 (System autoryzacji)

Projekt Bazy Danych (kan-36)

⚡ KAN-2 / ☒ KAN-36

## Projekt bazy danych



### ▼ Description

Definicja modeli danych używanych w projekcie, taki jak `artpiece`, `category` i inne.

#### Kryteria Akceptacji:

- Typy danych zostały zaakceptowane przez zespół.
- Typy danych są zdefiniowane w TypeScript.

Rysunek 3: Kryteria akceptacji dla zadania KAN-36 (Projekt bazy danych)

### Makieta Bento box (kan-34)

⚡ KAN-4 / ☒ KAN-34

## Koncepcja i makieta galerii Bento Box



### ▼ Description

Projekt siatki kafelków na stronę główną.

#### Kryteria Akceptacji:

- Zaprojektowano responsywną siatkę (grid) dla Desktop i Mobile.
- Zaprojektowano interakcje i stany kafelków (np. hover).

Rysunek 4: Kryteria akceptacji dla zadania KAN-34 (Makieta Bento Box)

## 7 . DEFINICJA UKOŃCZENIA

Element backlogu sprintu uznaje się za ukończony (Definition of Done), gdy:

- **Kod i Implementacja:**
  - Kod jest zgodny ze standardami (Lint/Prettier).
  - Infrastruktura (Docker) uruchamia się poprawnie jednym poleceniem.
  - Modele DrizzleORM odzwierciedlają projekt bazy danych.
- **Testowanie i Jakość:**
  - Funkcjonalność została przetestowana manualnie na środowisku lokalnym.
  - Zmiany przeszły pomyślnie Code Review (akceptacja przez innego członka zespołu).
- **Projektowanie (UI/UX):**
  - Projekty w Figma są dostępne dla całego zespołu i posiadają zdefiniowane komponenty (Design System).
- **Dokumentacja:**
  - Zaktualizowano odpowiednie pliki w repozytorium notes.
  - Status zadania w Jira został zmieniony na „Done”.
